



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Главные распорядители
средств федерального бюджета

(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

*Большая Пироговская ул., д.23
Москва, 119435
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.gov.ru*

04.06.2026 № 34227-ЮГ/11

На № _____ от _____.

О представлении аналитической
информации о ходе строительства за
II квартал 2026 г.

Компонент управления капитальными вложениями ГИИС «Электронный бюджет» (далее – Компонент УКВ) является системой первоисточником в отношении информации об объектах капитального строительства, которые реализуются в реестре объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета (далее – Реестр) и на основании которой Минстроем России формируется информация, направляемая в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

В частности, сведения об объектах по контрольным точкам и кассовому исполнению отображаются на дашборде у заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 33 Положения о порядке формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № 702 (далее – Положение), **руководители главных распорядителей средств федерального бюджета несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления в компоненте системы «Электронный бюджет» и в Минстрое России, содержащейся в документах и отчетности.**

С целью формирования аналитической информации о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в Реестр (далее – отчетность, Аналитическая информация), Минстрой России просит в срок **до 30 июня 2026 г. обеспечить в Компоненте УКВ заполнение корректных и достоверных данных в Сведениях по объектам** (в части уточнения сроков ввода, бюджетных ассигнований и т.д.), в том числе в части информации о фактическом достижении контрольных точек с документальным подтверждением, включая информацию о вводе объектов в эксплуатацию (в соответствии с Порядком мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества, утвержденного президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 11 июля 2025 г. № 89)).

На базе заполненных данных будет формироваться отчетность за II квартал 2026 г. в сроки, установленные пунктом 31 Положения.

При заполнении отчетности следует использовать *Особенности подготовки главными распорядителями средств федерального бюджета ежеквартальной аналитической информации о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, в Компоненте управления капитальными вложениями ГИИС «Электронный бюджет» в 2026 году*, направленные главным распорядителям средств федерального бюджета (далее – главные распорядители) письмом от 12 марта 2026 г. № 13600-ЮГ/11 и размещенные на сайте Минстроя России <https://www.minstroyrf.ru/> во вкладке «Документы».

При заполнении Аналитической информации в Компоненте УКВ главным распорядителям необходимо отразить **достоверную** информацию, в том числе по объектам капитального строительства, ввод которых предусмотрен в 2026 году. Особое внимание обратить на заполнение нарастающим итогом за весь период реализации объекта показателя **«Техническая готовность, %»**.

В связи с тем, что Аналитическая информация должна быть заполнена по состоянию на 30 июня 2026 г. в атрибутах «На дату» раздела «Сведения по исполнению НИ» и раздела «Сведения по исполнению технической готовности» необходимо указать **«30.06.2026»**. При этом заполнение Аналитической информации необходимо обеспечить **не позднее 14 июля 2026 года**.

Для удобства работы и в дополнение к вышеуказанному письму направляется Инструкция по работе с функционалом «Техническая готовность» и Инструкция по работе с функционалом «Расчет и отображение степени готовности ОКС (опережающее финансирование)».

Приложение на 13 л. в 1 экз.



Ю.С. Гордеев

Инструкция по работе с функционалом «Расчет и отображение степени готовности ОКС (опережающее финансирование)» в системе «Электронный бюджет»

1. В Реестре «Объекты капитального строительства» откройте Сведения об ОКС нужного ОКС. (рис. 1.1).

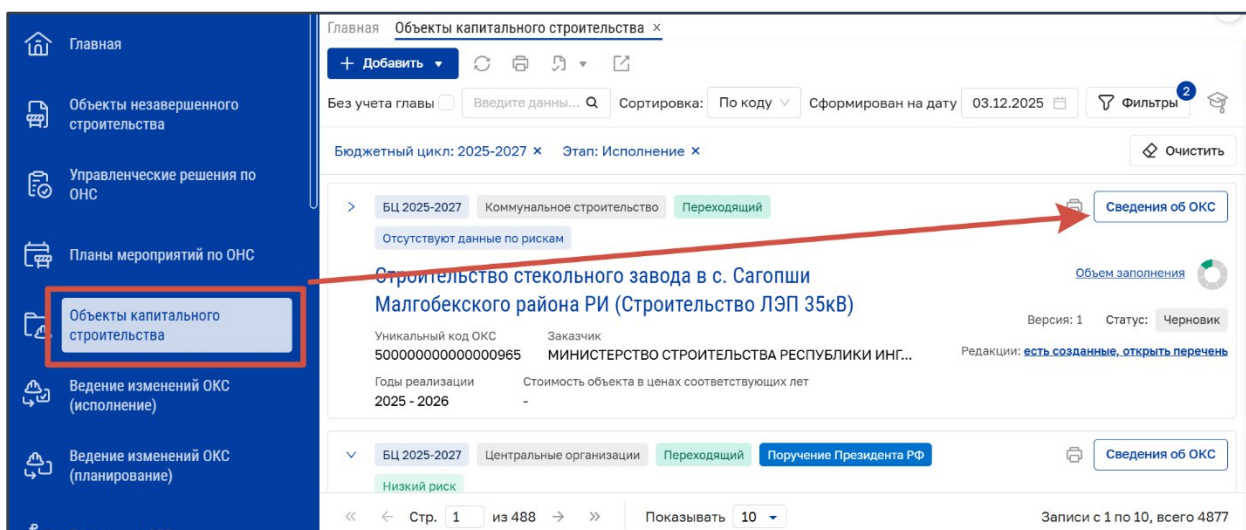


Рисунок 1.1

1.1. Создайте новую редакцию ОКС с видом «Изменение сведений об ОКС» (этап исполнение), (или используйте существующую редакцию ОКС с видом «Изменение сведений об ОКС» в статусе «Черновик») (рис 1.2), (рис. 1.3), (рис. 1.4).




Рисунок 1.2

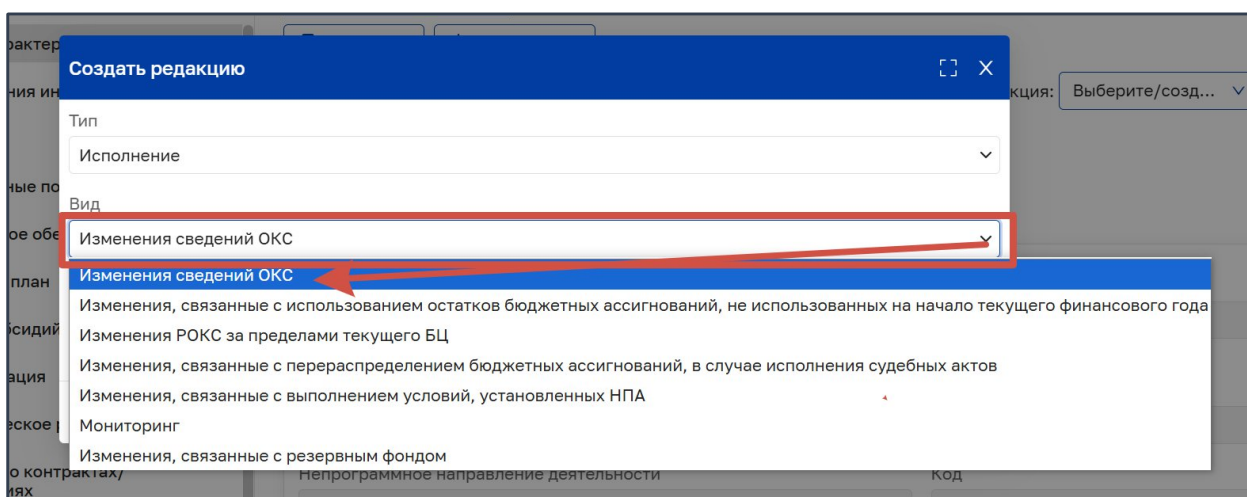


Рисунок 1.3

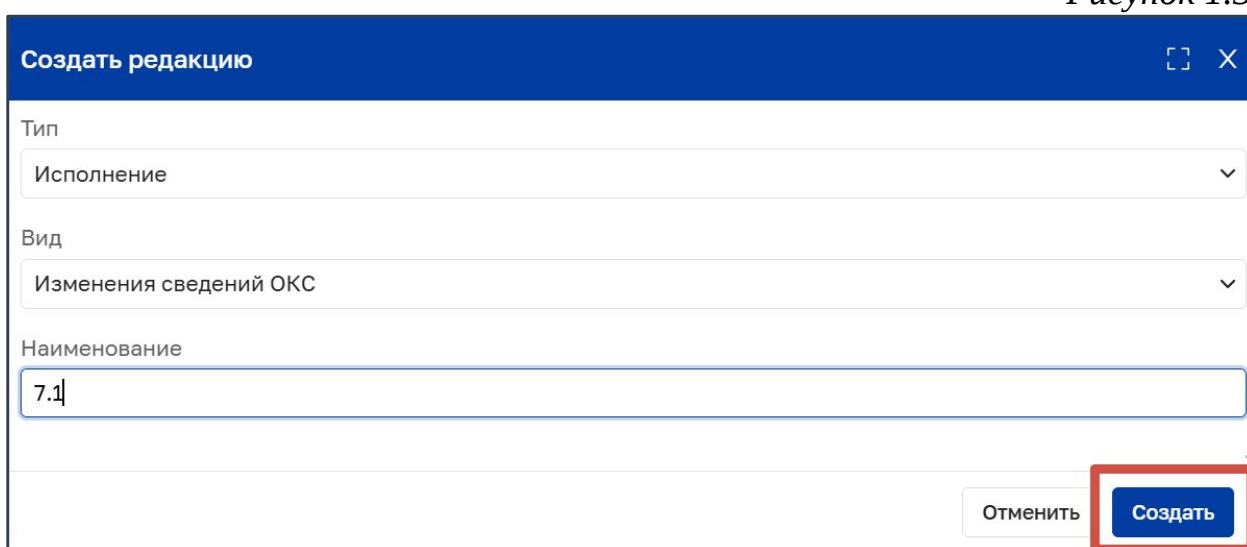


Рисунок 1.4

- 1.2. Перейдите в раздел «2. Направления инвестирования» и установите признак «Опережающее финансирование» = «Да». (рис. 1.5), (рис. 1.6).

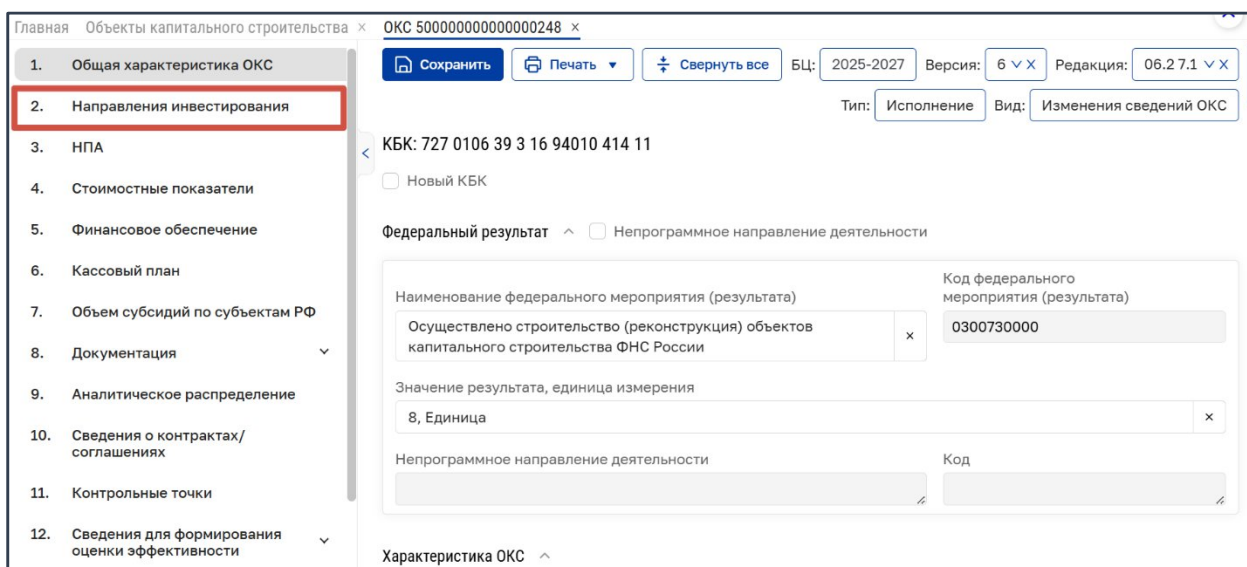


Рисунок 1.5

Главная Объекты капитального строительства x OKS 500000000000000248 x

1. Общая характеристика OKS

2. Направления инвестирования

3. НПА

4. Стоимостные показатели

5. Финансовое обеспечение

6. Кассовый план

7. Объем субсидий по субъектам РФ

8. Документация

9. Аналитическое распределение

10. Сведения о контрактах/соглашениях

11. Контрольные точки

12. Сведения для формирования оценки эффективности

Сохранить Печать

БЦ: 2025-2027 Версия: 6 x Редакция: 06.2 7.1 x

Тип: Исполнение Вид: Изменения сведений OKS

Направления инвестирования*

+ Добавить

☐ Пережающее финансирование

Единица измерения: тыс. руб.

ОКВЭД	Наименование НИ	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретение
84.11.4	проектные и изыскательские работы	2024
84.11.4	реконструкция	2026

Мощность направления инвестирования*

Наименование НИ	Наименование мощности	Единица измерения
		Код по ОКЕИ Наименк

Рисунок 1.6

1.3. Сохраните редакцию (рис. 1.7).

Главная Объекты капитального строительства x OKS 500000000000000248 x

1. Общая характеристика OKS

2. Направления инвестирования

3. НПА

4. Стоимостные показатели

5. Финансовое обеспечение

6. Кассовый план

7. Объем субсидий по субъектам РФ

8. Документация

9. Аналитическое распределение

10. Сведения о контрактах/соглашениях

Сохранить Печать

БЦ: 2025-2027 Версия: 6 x Редакция: 06.2 7.1 x

Тип: Исполнение Вид: Изменения сведений OKS

Направления инвестирования*

+ Добавить

☒ Пережающее финансирование

Единица измерения: тыс. руб.

ОКВЭД	Наименование НИ	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретение
84.11.4	проектные и изыскательские работы	2024
84.11.4	реконструкция	2026

Мощность направления инвестирования*

Наименование НИ	Наименование мощности	Единица измерения
		Код по ОКЕИ Наименк

Рисунок 1.7

Важно! В системе установлен предупреждающий контроль, срабатывающий в случае выбора Пользователем чекбокса «Опережающие финансирование» (одновременное выполнение трёх условий):

- одна из КТ должна быть сдвинута Пользователем «влево» (на более раннюю дату),
- в блоке «Направления инвестирования» по любому НИ увеличен объём БА на текущий год,
- в блоке «Объём средств» никакие параметры сметной стоимости не увеличивалась (не изменялись в большую сторону). (рис. 1.8).

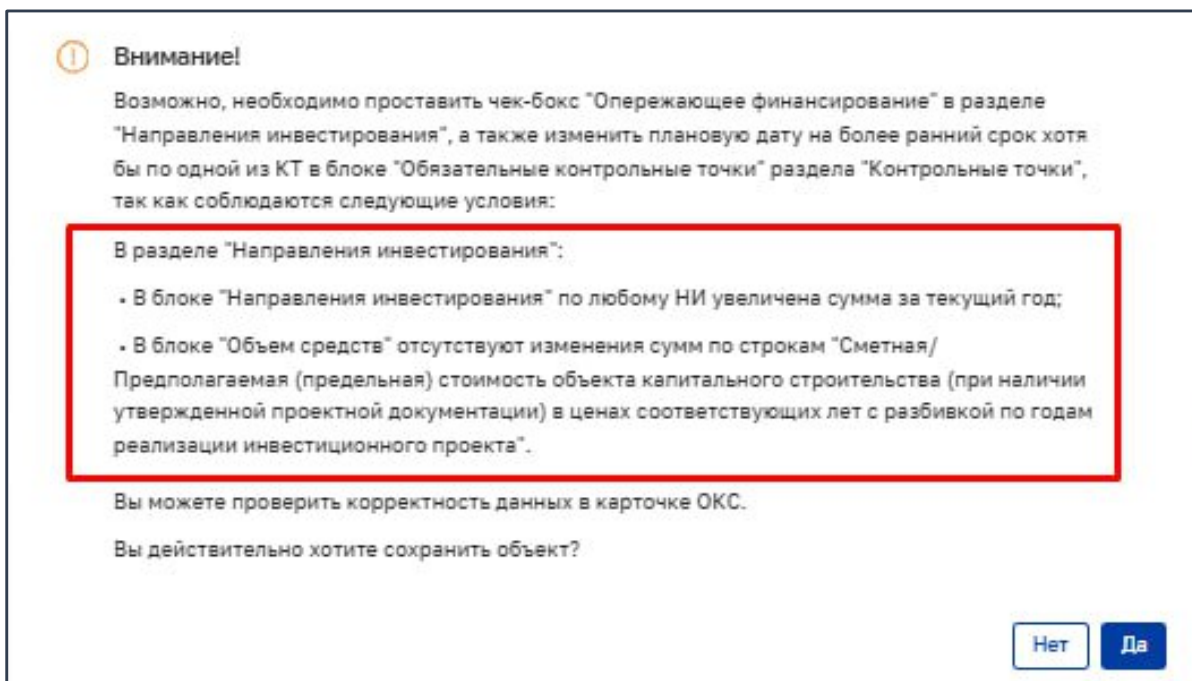


Рисунок 1.8

Важно! После сохранения система автоматически создаст строки в новых гридах «Техническая готовность» и «Строительная готовность» на дату создания редакции и отобразит предупреждение о необходимости заполнения данных в разделе «11. Контрольные точки». (рис. 1.9).

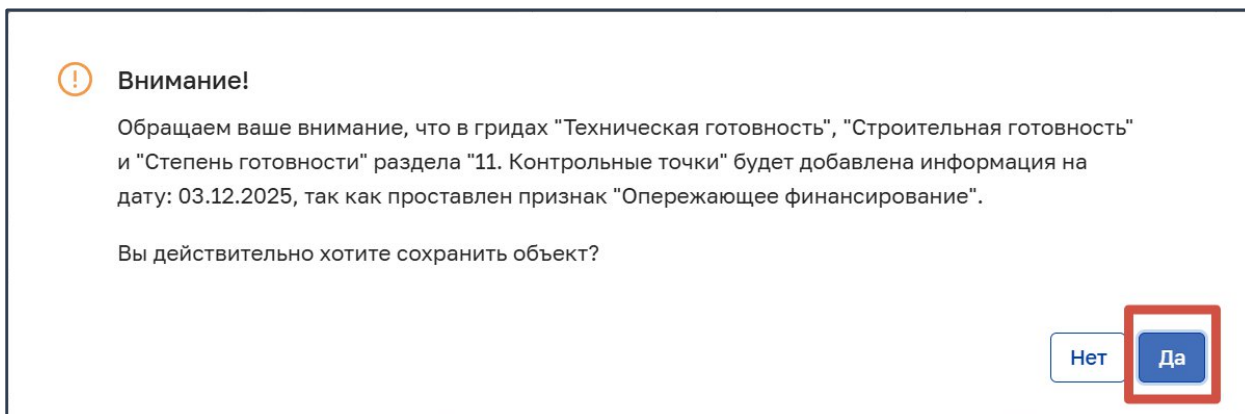


Рисунок 1.9

- Подтверждающие документы (обязательно — только для строки «Опережающее финансирование») (рис. 2.3).

Техническая готовность								
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы	
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина		
2025	24.11	☐	4	4	0		Прикреплено: 0	
2025	27.11	☐	17	17	0		Прикреплено файлов: 1	
2026	31.01	☒	23	23	0		Прикреплено: 0	

Рисунок 2.3

2.1.2. Если необходимо добавить контрольную точку «Опережающее достижение», нажмите кнопку «Добавить» и укажите дату в пределах срока реализации ОКС (от «Год начала реализации» до «Год окончания реализации»). (рис. 2.4).

Техническая готовность								
+ Добавить								
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы	
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина		
2025	03.12	☐			0		Прикреплено: 0	
		☐			0		Прикреплено: 0	

Рисунок 2.4

2.2. Грид «Строительная готовность». Отображается только при «Опережающем финансировании = Да». (рис. 2.5).

Строительная готовность								
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы	
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина		
2025	27.11	☐	15	15	0		Прикреплено файлов: 1	
2026	31.01	☒	27	27	0		Прикреплено: 0	

Рисунок 2.5

2.2.1. Заполните вручную:

- План, %
- Факт/Прогноз, % (и факт, и прогноз)
- Причину отклонения, если отклонение < 0
- Подтверждающие документы (обязательно — только для строки «Опережающее финансирование») (рис. 2.6).

Строительная готовность								
+ Добавить								
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы	
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина		
2025	03.12	☐			0		Прикреплено: 0	

Рисунок 2.6

2.2.2. Система автоматически рассчитает «Отклонение, п.п.» и применит цветовое оформление:

- чёрный – если отклонение = 0 (от факта),
- красный – если отклонение < 0 (от факта),
- зеленый – если отклонение > 0 (от факта),
- серый – если отклонение = 0 (от прогноза),
- серо-красным – если отклонение < 0 (от прогноза),
- серо-зеленым – если отклонение > 0 (от прогноза) (рис. 2.7).

Строительная готовность								
+ Добавить								
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы	
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина		
2025	03.12	☐	13	11	2		Прикреплено: 0	

Рисунок 2.7

2.3. Грид «Степень готовности». Отображается только при «Опережающем финансировании = Да» и не подлежит ручному редактированию. (рис. 2.8).

Степень готовности							
Год	Дата	Опережающее достижение	Факт/Прогноз, %	Прирост план, п.п.	Прирост факт, п.п.	Отклонение, п.п.	Редакция под опережающее финансирование
2025	27.11	☐	16,0				05.6
2026	31.01	☒	25,0	9,0			

Рисунок 2.8

2.3.1. Все значения рассчитываются автоматически:

- Факт/Прогноз, % = среднее арифметическое значений «Технической» и «Строительной» готовности на одну дату.
- Прирост план / факт, п.п. и Отклонение, п.п. – рассчитываются только для строки «Опережающее достижение».
- В столбце «Редакция под опережающее финансирование» отображается номер редакции, в которой был установлен признак (рис. 2.9).

Степень готовности							
Год	Дата	Опережающее достижение	Факт/Прогноз, %	Прирост план, п.п.	Прирост факт, п.п.	Отклонение, п.п.	Редакция под опережающее финансирование
2025	03.12	☐	15,0				06.2

Рисунок 2.9

Важно! Строки в гриде создаются автоматически при добавлении соответствующих дат в гридах «Техническая» и «Строительная готовность».

2.4 Редактирование доступно в редакциях вида:

- Изменение сведений ОКС;
- Изменение сведений ОКС (субъектовый);

- Мониторинг;
- Мониторинг для юридических лиц, получателей субсидий
- Предложения по распределению базовых БА (показателей проекта ФБ) – если отсутствует актуальная версия ОКС этапа «Исполнение» в текущем бюджетном цикле.

3. Контроль и уведомления

3.1. При наличии признака «Опережающее финансирование = Да» система требует обязательного заполнения всех открытых полей в гридах «Техническая» и «Строительная готовность». (рис. 3.1).

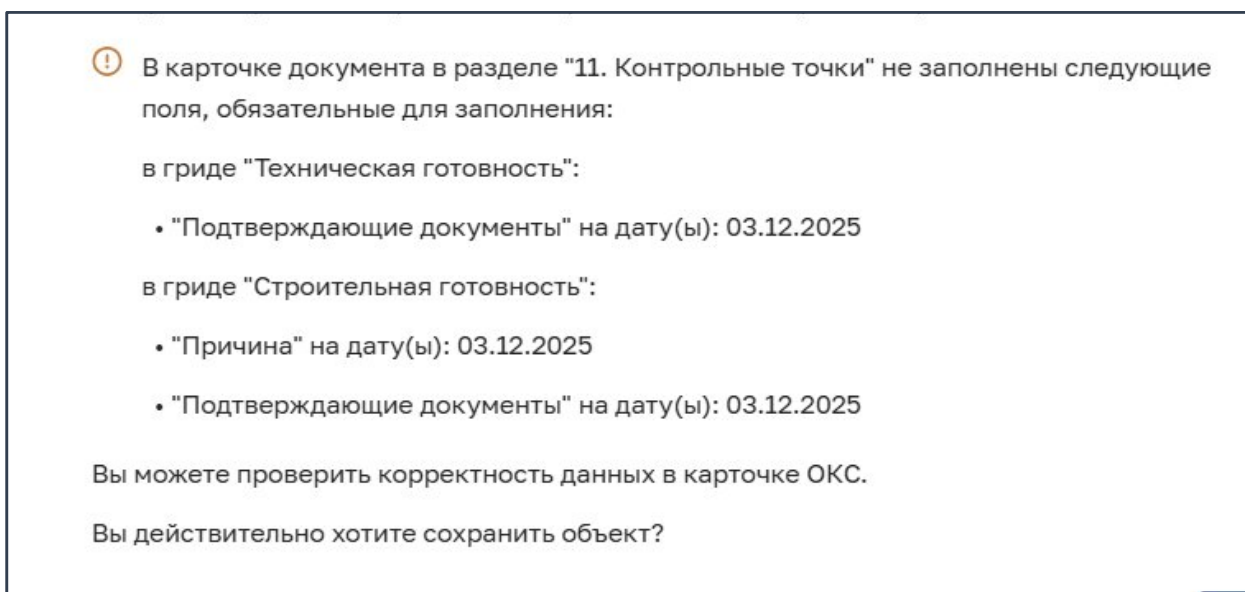


Рисунок 3.1

3.2. При попытке сдвинуть даты КТ влево, увеличить бюджет без изменения сметы и при незаполненном факте — система предложит установить признак «Опережающее финансирование».

4. Согласование и дальнейшая работа

4.1. После заполнения всех обязательных полей сохраните и согласуйте редакцию ОКС внутри ГРБС. (рис. 4.1).

Главная Объекты капитального строительства x ОКС 500000000000000248 x

1. Общая характеристика ОКС
2. Направления инвестирования
3. НПА
4. Стоимостные показатели
5. Финансовое обеспечение
6. Кассовый план
7. Объем субсидий по субъектам РФ
8. Документация
9. Аналитическое распределение
10. Сведения о контрактах/соглашениях
11. Контрольные точки
12. Сведения для формирования оценки эффективности
13. Журнал изменений
14. Мониторинг

БЦ: 2025-2027 Версия: 6 v x Редакция: 06.27.1 v x
Тип: Исполнение Вид: Изменения сведений ОКС

Обязательные контрольные точки

Наименование	Вид КТ	Дата		Просрочка	Причина отклонения	При
		План	Факт/Прогноз			
Получены положительные заключения по результатам го...	Специальная	31.03.2025	12.12.2024			ГЭ
Земельный участок предоставлен заказчику	Специальная					
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	Специальная	30.04.2025	17.01.2025			
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ ...	Специальная	30.11.2023	30.10.2023			Контр
Технологическое оборудование, предусмотренное прок...	Специальная	30.09.2026				
Объект подключен к сетям инженерно-технического обе...	Рекомендуемая	30.08.2026				
Заключение органа государственного строительного над...	Специальная	31.10.2026				
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	Специальная	30.11.2026				
Государственная регистрация права на объект недвижи...	Специальная	20.12.2026				

Иные контрольные точки

+ Добавить

Наименование	Вид КТ	Дата		Просрочка	Причина отклонения	При
		План	Факт/Прогноз			

Рисунок 4.1

4.2. После сохранения новые данные о готовности станут доступны:

- в разделе «Мониторинг» (поле «Техническая готовность объекта» и grid «Сведения по исполнению технической готовности») – автоматически, на основании фактических значений в gridе «Техническая готовность»

1. Общая характеристика ОКС
2. Направления инвестирования
3. НПА
4. Стоимостные показатели
5. Финансовое обеспечение
6. Кассовый план
7. Объем субсидий по субъектам РФ
8. Документация
9. Аналитическое распределение
10. Сведения о контрактах/соглашениях
11. Контрольные точки
12. Сведения для формирования оценки эффективности
13. Мониторинг
14. Журнал изменений

Этап: Исполнение БЦ: 2025-2027 Версия: 6 v x Редакция: Выберите/созд... v x

Полнотранзитное: 1 из 1
100,00% 1 из 1

1 Все 1 Достигнута в срок 0 Достигнута с нарушением срока 0 Не достигнута 0 Срок не наступил

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Техническая готовность объекта: 0%

Кассовое исполнение 0,0	Посмотреть все данные >	Принятые БО 0,0	Посмотреть все данные >	Принимаемые БО 0,0	Посмотреть все данные >
Денежные обязательства 0,0	Посмотреть все данные >	Фактически освоено 0,0		Объем дебиторской задолженности 0,0	Посмотреть все данные >
Объем кредиторской задолженности 0,0	Посмотреть все данные >	Авансовые платежи 0,0		Профинансировано 0,0	

Посмотреть сведения по исполнению

Контрольные точки

Рисунок 4.2

Сведения по исполнению										X
Сведения по исполнению НИ										Единица измерения: тыс. руб. Профинансировано (на т
КБК	На дату	Направления инвестирования	Кассовое исполнение (нарастающим итогом)				Причины низкого кассового исполнения	Единица измерения: тыс. руб. Профинансировано (на т		
			За счет средств федерального бюджета	За счет средств бюджета субъекта РФ	За счет средств местного бюджета	За счет средств прочих источников		За счет средств федерального бюджета	За счет средств бюджета субъекта РФ	
108 0409 24 2 И7 70110 414 09	01.07.2025	проектные и изыскательск...	0,0	0,0	0,0	0,0	Кассовое исполнение запл...	0,0	0,0	
108 0409 24 2 И7 70110 414 09	01.07.2025	реконструкция	0,0	0,0	0,0	0,0	Кассовое исполнение запл...	0,0	0,0	
Сведения по исполнению технической готовности										
На дату	Техническая готовность, %	Код	Актуальное состояние вводного объекта		Описание технического результата		Сведения об объекте, ввод или приобретение которых не были осуществлены в установленные сроки			
			Наименование							
01.07.2025	0	16	Иное (с обязательным пояснением в графе "Описание техническ...		В настоящее время выполняются проектно-изыскательские рабо...					
24.11.2025	4									
27.11.2025	17	16	Иное (с обязательным пояснением в графе "Описание техническ...		В настоящее время выполняются проектно-изыскательские рабо...					

Рисунок 4.3

Важно! Редакции с опережающим финансированием подлежат обязательному заполнению по всем полям контроля, включая прикрепление подтверждающих документов.

Инструкция по работе с функционалом «Техническая готовность»

1. В Реестре «Объекты капитального строительства» откройте Сведения об ОКС нужного ОКС. (рис. 1.1).

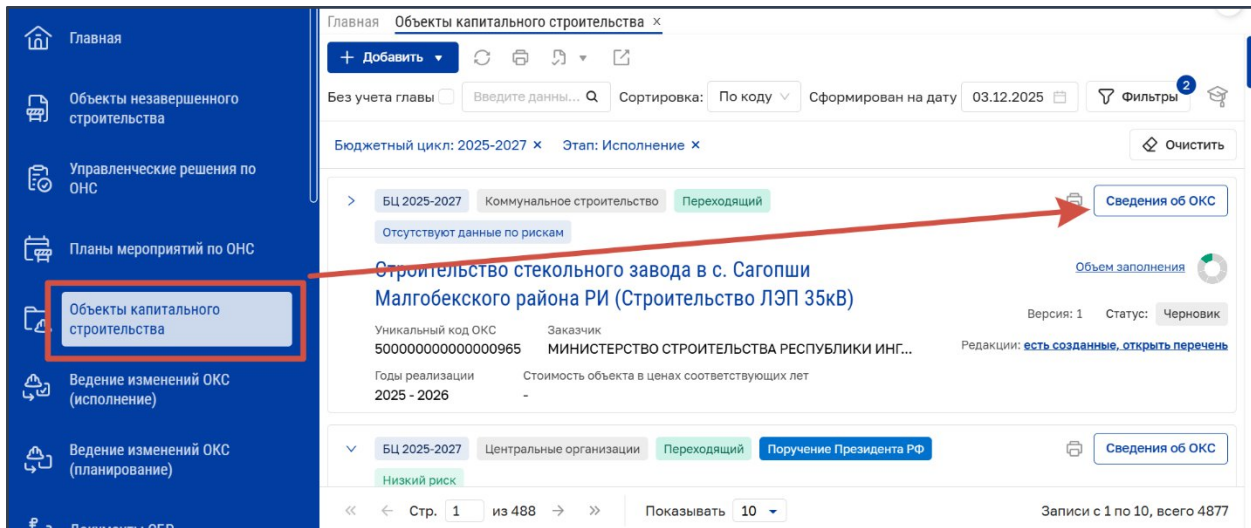


Рисунок 1.1

1.1. Создайте новую редакцию ОКС с видом «Мониторинг» или используйте существующую редакцию ОКС с видом «Мониторинг» в статусе «Черновик» (рис 1.2).




Рисунок 1.2

2. Заполнение грида «Техническая готовность» раздела «11. Контрольные точки».

2.1. Грид «Техническая готовность» отображается всегда (рис. 2.1).

Техническая готовность							
Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		Отклонение		Подтверждающие документы
			План, %	Факт/Прогноз, %	п.п.	Причина	
2025	24.11	☐	4	4	0		Прикреплено: 0
2025	27.11	☐	17	17	0		Прикреплено файлов: 1
2026	31.01	☒	23	23	0		Прикреплено: 0

Рисунок 2.1

2.2. Если необходимо добавить контрольную точку «Техническая готовность», нажмите кнопку «Добавить» и укажите дату в пределах срока реализации ОКС (от «Год начала реализации» до «Год окончания реализации»). (рис. 2.2). **(дата не позднее последнего дня отчетного периода, например, в аналитической информации за 1 полугодие - 30 июня)**

Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		п.п.	Отклонение Причина	Подтверждающие документы
			План, %	Факт/Прогноз, %			
2025	03.12	☐			0		Прикреплено: 0
		☐			0		Прикреплено: 0

Рисунок 2.2

2.3. Вручную укажите:

- План, %
- Факт/Прогноз, % (и факт, и прогноз)
- Причину отклонения (если отклонение < 0)
- Подтверждающие документы (при необходимости) (рис. 2.3).

Год	Дата	Опережающее достижение	Прирост		п.п.	Отклонение Причина	Подтверждающие документы
			План, %	Факт/Прогноз, %			
2025	24.11	☐	4	4	0		Прикреплено: 0
2025	27.11	☐	17	17	0		Прикреплено файлов: 1
2026	31.01	☒	23	23	0		Прикреплено: 0

Рисунок 2.3

2.4. Система автоматически рассчитает «Отклонение, п.п.» и применит цветовое оформление:

- чёрный – если отклонение = 0 (от факта),
- красный – если отклонение < 0 (от факта),
- зеленый – если отклонение > 0 (от факта),
- серый – если отклонение = 0 (от прогноза),
- серо-красным – если отклонение < 0 (от прогноза),
- серо-зеленым – если отклонение > 0 (от прогноза).

3. Согласование и дальнейшая работа

3.1. После заполнения всех обязательных полей сохраните и согласуйте редакцию ОКС внутри ГРБС. (рис. 3.1).

Главная Объекты капитального строительства ОКС 500000000000000248

БЦ: 2025-2027 Версия: 6 x Редакция: 06.2 7.1 x

Тип: Исполнение Вид: Изменения сведений ОКС

Обязательные контрольные точки

Наименование	Вид КТ	Дата		Просрочка	Причина отклонения	Прим
		План	Факт/Прогноз			
Получены положительные заключения по результатам го...	Специальная	31.03.2025	12.12.2024			ГЭ
Земельный участок предоставлен заказчику	Специальная					
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	Специальная	30.04.2025	17.01.2025			
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ ...	Специальная	30.11.2023	30.10.2023			Контр
Технологическое оборудование, предусмотренное проэк...	Специальная	30.09.2026				
Объект подключен к сетям инженерно-технического обе...	Рекомендуемая	30.08.2026				
Заключение органа государственного строительного над...	Специальная	31.10.2026				
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	Специальная	30.11.2026				
Государственная регистрация права на объект недвижи...	Специальная	20.12.2026				

Иные контрольные точки

+ Добавить

Рисунок 3.1

3.2. После сохранения новые данные о готовности станут доступны:

- в разделе «Мониторинг» (поле «Техническая готовность объекта» и grid «Сведения по исполнению технической готовности») – автоматически, на основании фактических значений в gridе «Техническая готовность»

Этап: Исполнение БЦ: 2025-2027 Версия: 6 x Редакция: Выберите/создайте...

Полнотемпловое: лучше 100,00% 1 из 1

1 Все 1 Достигнута в срок 0 Достигнута с нарушением срока 0 Не достигнута 0 Срок не наступил

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Техническая готовность объекта: 0%

Кассовое исполнение	Посмотреть все данные	Принятые БО	Посмотреть все данные	Принятые БО	Посмотреть все данные
0,0		0,0		0,0	
Денежные обязательства	Посмотреть все данные	Фактически освоено		Объем дебиторской задолженности	Посмотреть все данные
0,0		0,0		0,0	
Объем кредиторской задолженности	Посмотреть все данные	Авансовые платежи		Профинансировано	
0,0		0,0		0,0	

Посмотреть сведения по исполнению

Контрольные точки

Рисунок 3.2

Сведения по исполнению

Сведения по исполнению НИ

КБК	На дату	Направление инвестирования	Кассовое исполнение (нарастающим итогом)				Причины низкого кассового исполнения	Единица измерения: тыс. руб. Профинансировано (на т...	
			За счет средств федерального бюджета	За счет средств бюджета субъекта РФ	За счет средств местного бюджета	За счет средств прочих источников		За счет средств федерального бюджета	За счет средств бюджета субъекта РФ
108 0409 24 2 И7 70110 414 09	01.07.2025	проектные и изыскательские...	0,0	0,0	0,0	0,0	Кассовое исполнение зап...	0,0	0,0
108 0409 24 2 И7 70110 414 09	01.07.2025	реконструкция	0,0	0,0	0,0	0,0	Кассовое исполнение зап...	0,0	0,0

Сведения по исполнению технической готовности

На дату	Техническая готовность, %	Код	Актуальное состояние вводного объекта		Описание технического результата	Сведения об объекте, ввод или приобретение которых не были осуществлены в установленные сроки
			Наименование	Описание		
01.07.2025	0	16	Иное (с обязательным пояснением в графе "Описание технич...		В настоящее время выполняются проектно-изыскательские рабо...	
24.11.2025	4					
27.11.2025	17	16	Иное (с обязательным пояснением в графе "Описание технич...		В настоящее время выполняются проектно-изыскательские рабо...	

Рисунок 3.3

Список рассылки

№ п/п	код ГРБС	Полное наименование	кол- во ЭКЗ.
1	020	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	1
2	022	Министерство энергетики Российской Федерации	1
3	048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1
4	051	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	1
5	052	Федеральное агентство водных ресурсов	1
6	054	Министерство культуры Российской Федерации	1
7	056	Министерство здравоохранения Российской Федерации	1
8	071	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	1
9	073	Министерство просвещения Российской Федерации	1
10	075	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	1
11	076	Федеральное агентство по рыболовству	1
12	081	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	1
13	082	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	1
14	092	Министерство финансов Российской Федерации	1
15	103	Министерство транспорта Российской Федерации	1
16	106	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1
17	107	Федеральное агентство воздушного транспорта	1
18	108	Федеральное дорожное агентство	1
19	110	Федеральное агентство морского и речного транспорта	1
20	139	Министерство экономического развития Российской Федерации	1
21	141	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	1
22	149	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	1
23	168	Федеральная служба по интеллектуальной собственности	1
24	169	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды	1
25	177	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	1
26	180	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	1
27	182	Федеральная налоговая служба	1
28	187	Министерство обороны Российской Федерации	1
29	188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1
30	303	Управление делами Президента Российской Федерации	1
31	310	Министерство иностранных дел Российской Федерации	1
32	320	Федеральная служба исполнения наказаний	1
33	322	Федеральная служба судебных приставов	1
34	350	Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	1

35	384	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	1
36	385	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"	1
37	388	Федеральное медико-биологическое агентство	1
38	415	Генеральная прокуратура Российской Федерации	1
39	417	Следственный комитет Российской Федерации	1
40	424	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"	1
41	438	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	1
42	595	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	1
43	597	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"	1
44	725	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	1
45	727	Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства"	1
46	730	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	1
47	777	Министерство спорта Российской Федерации	1
